

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR										
Fecha de elaboración del informe	01	04	2022	Periodo de seguimiento	Del 17-01-2022 al 31-03-2022	Informe número	4			
Nombre del supervisor o Interventor	CARLOS HARVEY SALAMANCA				Correo electrónico					
Cargo	Vicerrector de Investigación y Proyección Social				viceinvestigaciones@usco.edu.co					
Dependencia	Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social									
Nombre del apoyo a la supervisión	JENNIFER MONTERO VARGAS				Correo electrónico					
Cargo	Apoyo a la supervisión				jennifer.montero@usca.edu.co					
2. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR (SI APLICA)										
Número del contrato	N.A									
Objeto del contrato	N.A									
Plazo inicial del contrato del interventor	N.A			Fecha inicio del contrato	N.A		Fecha terminación del contrato	N.A		
Plazo adicional del contrato del supervisor	N.A			Valor inicial del contrato	N.A		Valor pagos	\$		
Plazo final contrato del interventor	N.A			Valor adicional	N.A					
Tiempo transcurrido del contrato	N.A			Valor final del contrato	N.A					
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO										
BPIN	Nombre del proyecto						Vigencia de los recursos			
2020000100011	Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad Alzheimer en adultos mayores del surcolombiano Huila, Caquetá						2019-2020			
OCAD	Ciencia, Tecnología e Innovación.			Acuerdo aprobatorio	No.	Fecha	Valor aprobado	Votación aprobación del proyecto		
					97	04/09/2020	\$1.901.531.315,82	Si	No	
Plazo Inicial (meses)		Descripción Alcance del Proyecto			Identificación de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad de Alzaheimer.					
36 Meses										
4. ALCANCE ENTREGABLES:										
Indicador				Cantidad		Porcentaje de cumplimiento				
Infraestructura para la investigación adecuada				1		98,00 %				
Medido a través de: Número de infraestructura				2		33,00 %				

Medido a través de: Número de infraestructura		
Artículos de investigación		
Medido a través de: Número de artículos	1	15,00 %
Documentos de investigación		
Medido a través de: Número de libros y/o capítulos	1	15,00 %

Localización	Departamento	Huila - Caquetá	No. de beneficiarios	Certificado cumplimiento de requisitos de ejecución		Fuentes de financiación SGR		Otras fuentes	
	Municipio	Neiva - Florencia		Si	No	Directas	Fondo (CTel)	Dinero	Especie
	Corregimiento	No aplica		240	X	N/A	\$1.901.531.315,82	\$31.920.060	\$372.623.202
	Vereda	No aplica							
	Otro	No aplica							

Avance de ejecución	% GESPROY	Sector	Área de influencia Segun la Ley 386 de 1997	Alertas no subsanadas (GESPROY)	
Físico	29,96	Ciencia, Tecnología e Innovación	Urbano	X	Proyectos: Contrato(s) sin rp: CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA; MEMORANDO N 0105-H
Financiero	40,74		Rural		

5. RELACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO

Contrato No.	Fecha	Objeto	% de Avance Físico
VIPS 160 A2021	3/03/2021	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL EN EL MARCO DEL PROYECTO MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO REGALIAS BPIN 2020000100011	100%
VIPS 179 A2021	25/03/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURÍDICA EN EL PROYECTO TITULADO ¿ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ con BPIN 2020000100011	100%
VIPS 180 A2021	25/03/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE EN EL PROYECTO TITULADO ¿ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ con BPIN 2020000100011	100%



VIPS 184 A2021	25/03/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL PROYECTO TITULADO: ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ con BPIN 2020000100011	100%
VIPS 204 A2021	23/04/2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SUR COLOMBIANO HUILA Y CAQUETA CODIGO BP 2020000100011.	100%
VIPS 206 A2021	23/04/2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SUR COLOMBIANO HUILA Y CAQUETA CODIGO BP 2020000100011.	100%
VIPS 205 A2021	23/04/2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA CON DOCTORADO EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SUR COLOMBIANO HUILA Y CAQUETA CODIGO BP 2020000100011.	100%
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA	29/05/2021	AUNAR ESFUERZOS EN PRO DE LA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LA ALIANZA "BIENESTAR PARA NUESTROS MAYORES" DANDO LOS LINEAMIENTOS PARA LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ALIADAS Y LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO, LOGRANDO UNA VINCULACIÓN DE LOS DESARROLLOS CIENTIFICOS PARA LA ACADEMIA Y LA COMUNIDAD DEL SUR COLOMBIANO	0%
VIPS 285 A2021	25/06/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN EMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL UR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ con BPIN 2020000100011	100%
VIPS 286 A2021	25/06/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER	100%



		EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA con BPIN 2020000100011	
MEMORANDO No. 028	29/07/2021	PRESTAR SERVICIOS RUDY DANIELA RODRIGUEZ VAQUIRO COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL EN ÁREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO ¿ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA CON CÓDIGO BPIN 2020000100011.	100%
001 2021	29/07/2021	PRESTAR SERVICIOS MARIO ALFREDO PARRA RODRIGUEZ COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD CON DOCTORADO EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA CON CÓDIGO BPIN 2020000100011. (EJECUTARÁ ACTIVIDAD ACADÉMICA REMUNERADA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 001)	100%
MEMORANDO No. 0043	19/08/2021	SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) CON CARGO AL CDP No. 4221, AVNCE NEIVA \$1.392.000, AVANCE FLORENCIA \$960.000	100%
VIPS 286 A 2021	19/08/2021	SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) CON CARGO AL CDP No. 4221, AVNCE NEIVA \$1.392.000, AVANCE FLORENCIA \$960.000	100%
CONVENIO 001 2021	27/08/2021	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION ENTRE LA USCO Y LA UNIAMAZONIA ANUAR ESFUERZO EN PRO DE GESITION EFICIENTE Y EFICAZ DE ALIANZA DE BIENESTAR PARA NUESTROS MAYORES DANDO LOS LINEAMIENTOS PARA LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ALIADAS Y LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO LOGRANDO UN VINCULACIÓN DE LOS DESARROLLOS CIENTIFICOS PARA LA ACADEMIA Y COMUNIDAD DEL SUR COLOMBIANO. BPIN 2020000100011.	100%
MEMORANDD No. 0045	30/08/2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO ¿ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA? CÓDIGO BPIN 2020000100011	100%
0053	10/09/2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL CON MAESTRÍA EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO ¿ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO	100%

		PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA? CÓDIGO BPIN 2020000100011	
MEMORANDO No. 0061	22/09/2021	SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) POR UN TOTAL DE \$1.920.000, CON CARGO AL CDP No. 4221 FUENTE DE FINANCIACIÓN HUILA, AVANCE DE TRANSPORTE PARA NEIVA \$960.000, AVANCE DE TRANSPORTE PARA FLORENCIA \$960.000	100%
CONTRATO DE COMPRAVENTA OC 063 2021	1/10/2021	COMPRA DE INSUMO CONSUMIBLES DE LABORATORIO Y OTROS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO ESTUDIOS DE UN MARCADOR COGNITIVOS PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SURCOLOMBIANO HUILA. CAQUETA, CON CODIGO BPIN 202000100011.	100%
ORDEN DE SERVICIO 010 2021	13/10/2021	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS CON DESTINO AL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA, CON CODIGO BPIN 2020000100011 PARA LA CIUDAD DE NEIVA.	100%
SOLICITUD No. 0005	20/10/2021	SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) POR UN TOTAL DE \$960.000, CON CARGO AL CDP No. 4221 FUENTE DE FINANCIACIÓN HUILA, AVANCE DE TRANSPORTE PARA NEIVA \$960.000	100%
MEMORANDO No. 0006	20/10/2021	SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) POR UN TOTAL DE \$960.000, CON CARGO AL CDP No. 4221 FUENTE DE FINANCIACIÓN HUILA, AVANCE DE TRANSPORTE PARA FLORENCIA \$960.000	100%
FORMATO SOLICITUD AVANCE No. 009	22/11/2021	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN NEIVA ENTRE EL 2 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021	100%
FORMATO SOLICITUD AVANCE No. 0010	22/11/2021	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN FLORENCIA ENTRE EL 2 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021	100%
FORMATO SOLICITUD AVANCE NO. 0007	22/11/2021	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN NEIVA ENTRE EL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	100%
FORMATO SOLICITUD AVANCE No. 0008	22/11/2021	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD	100%

		ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN FLORENCIA ENTRE EL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	
VIPS 583 B2021	9/12/2021	SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIONAL EN EL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES SURCOLOMBIANO HUILA , CAQUETA BPIN 202000010001.	100%
VIPS-SGR-004	17/01/2022	Prestar los servicios profesionales como apoyo a la supervisión del proyecto ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA BPIN 2020000100011.	17%
VIPS-SGR-030	21/01/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA CAQUETÁ BPIN 2020000100011	37%
VIPS-SGR-031	21/01/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURIDICA EN EL PROYECTO TITULADO *ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA CAQUETÁ* BPIN 2020000100011	37%
VIPS-SPGR-045-A2022	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO *ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	24%
VIPS-SGR-040	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO *ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	45%
VIPS-SGR-039	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO *ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	45%
VIPS-SGR-046	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CON MAESTRÍA EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO *ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	63%
VIPS-SGR-043	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO *ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO	45%

		PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	
VIPS-SGR-052	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA CON DOCTORADO EN EL PROYECTO TITULADO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO"	23%
MEMORANDO N 0105-H	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO"	0%
VIPS-SGR-041	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO"	45%
VIPS-SGR-044	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO"	45%
VIPS-SGR-053	27/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO"	27%
VIPS-SGR-042	28/01/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO"	45%
MEMORANDO 08-FEB-2021	14/02/2022	SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA QUE LOS ADULTOS MAYORES VINCULADOS AL PROYECTO CÓDIGO BPIN 2020000100011 PARA QUE SE DIRIJAN AL LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN INICIAL QUE SE REALIZARÁN EN LA CIUDAD DE FLORENCIA	100%
MEMORANDO 25 FEB 2022	2/03/2022	Solicitud de avance para desplazamiento de los adultos mayores al laboratorio con el fin de realizar trabajo de campo desde el 02 de Marzo al 30 de Marzo de 2022	100%

El valor total contratado a la fecha del presente informe es: **\$1.005.455.792**; sin incluir el CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA presenta duplicada del convenio y el contrato MEMORANDO N 0105-H el cual por datos erróneos en el RP se debió anular lo que generó duplicidad de un contratista en el Gesproy.

Cabe aclarar que durante el presente trimestre objeto de informe se generó un RP en el SPGR con datos erróneos; lo cual hizo necesario que el responsable del SPGR realizará la anulación de este para proceder a generar uno nuevo bajo los datos correctos generando inconvenientes en la plataforma del Gesproy la cual evidencio una alerta; por lo tanto en el mes de marzo se solicitó copia del RP anulado para proceder a registrar desde la aplicación y cargar un acta de liquidación en cero (\$0) en el próximo reporte en el aplicativo Gesproy con respecto al siguiente contrato:




No. Contrato	Nombre del Contratista	Identificación	Fecha de inicio	Fecha final	Objeto	Valor Contratado
MEMORANDO N 0105-H	CALCETO GARAVITO LAURA NATALIA	1075291320	27/01/2022	17/06/2022	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN EL PROYECTO "ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO	\$ 15.5680.581

5.1 PRÓRROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)



No. contrato	No. adicional	Descripción	fecha	Tiempo	Valor	Aclaratorio	Cesión de contrato
CONVENIO 001 2021	02	Se suscribió Otrrosi No. 2 el 24 de enero de 2022 al convenio suscrito entre la Universidad SURCOLOMBIANA y la Universidad de la AMAZONIA; el cual consistió en la modificación de la cláusula tercera Valor del Convenio quedando este por valor de \$ 440.716.480 M/CTE y la modificación de cláusula Cuarta en el sentido de adicionar al valor del contrato la suma de \$63.018.399 por lo cual la cláusula cuarta quedo así: "CUARTA. DESEMBOLSOS: LA UNIVERSIDAD realizara una transferencia por valor de sesenta y tres millones dieciocho mil trescientos noventa y nueve pesos (\$63.018.399) provenientes del Sistema General de Regalías a la cuenta que aportara LA UNIAMAZONIA."	24/01/2022	N.A	\$ 63.018.399	N.A	N.A


6. LOCALIZACION

Las actividades se vienen desarrollando en dos municipios (Neiva y Florencia), la sede principal del proyecto está en la ciudad de Neiva, en la carrera 10 # 3 -64 barrio altico, en donde se encuentra el laboratorio de neuropsicología de la Universidad Surcolombiana, a continuación, se relaciona material audiovisual del sitio donde se desarrollan las actividades de igual manera registro fotográfico de las adecuaciones realizada en la UNIAMAZONIA

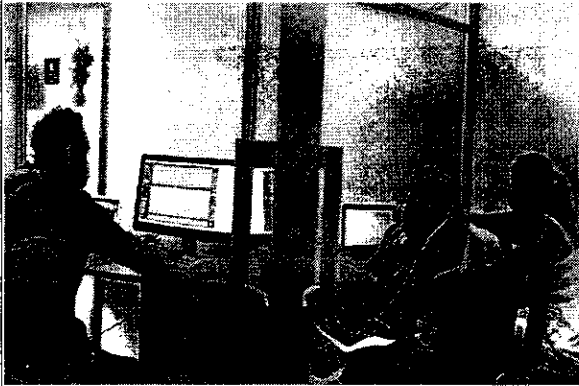

Adecuaciones realizadas en el laboratorio de la UNIAMAZONIA

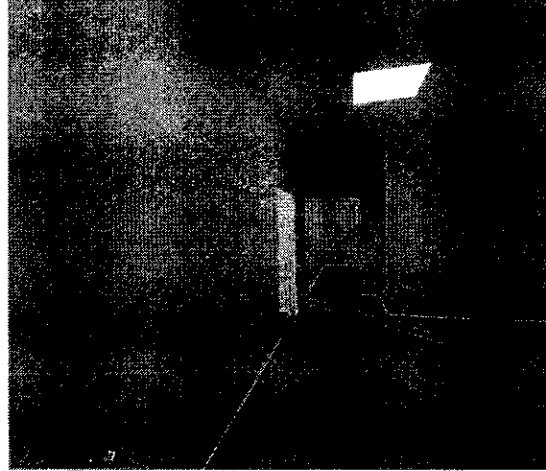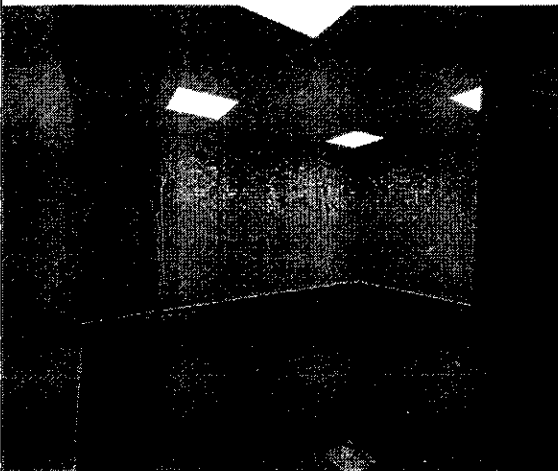

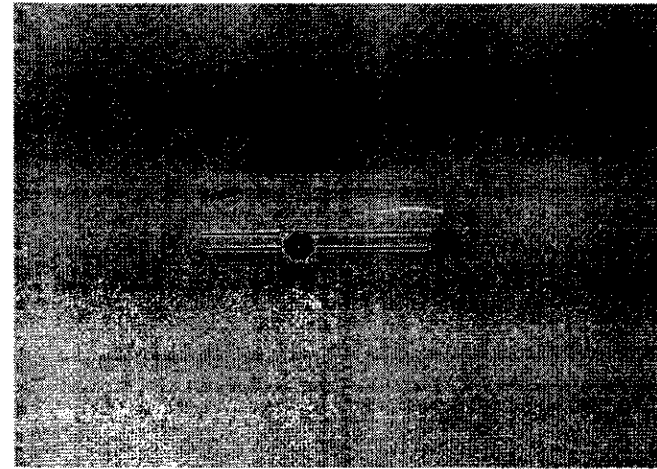

Equipos adquiridos en la ejecución del proyecto a la fecha Biosemi, Impresora, adquisición de elementos e insumos para laboratorio.



7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN

Durante el periodo comprendido del 17/01/2022 a 31/03/2022 se logró verificar que la ejecución del proyecto en cada uno de sus objetivos es la siguiente:

Cabe resaltar que durante el periodo mencionado anteriormente se logró avanzar en dos de los tres objetivos específicos dando como resultado cada uno de los análisis y balances que se relacionan a continuación permitiendo identificar el valor proyectado, ejecución realizada a corte del 31/03/2022, saldo por ejecutar y finalmente el porcentaje de ejecución de cada uno.

Como primer Objetivo específico del proyecto tenemos:

1. Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas por valor de: \$ 769.277.280

1.1 Infraestructura para la investigación adecuada por valor de: \$ 141.900.610

1.1.1 Adecuar infraestructura para laboratorio con un costo: \$ 62.401.482

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
Infraestructura	\$57.172.748,00	\$57.024.493,00	\$148.255,00	100%
Infraestructura- Efectivo-UA	\$5.228.734,00	\$0,00	\$5.228.734,00	0%
TOTAL	\$62.401.482,00	\$57.024.493,00	\$5.376.989,00	91%

En este periodo se continuo con las adecuaciones del laboratorio de la UNIAMAZONIA el cual a corte del 28 de febrero tenía un avance físico del 80% logrando al mes de Marzo llegar a un 91% de las adecuaciones quedando pendiente la ejecución del rubro en especie (Infraestructura-Efectivo-UA) el cual será certificado una vez se haya terminada la obra del laboratorio de la Unimazonia en su totalidad con respecto al mobiliario del área adecuada y una puerta corrediza que a la fecha no se ha instalado.

11 de febrero del 2022, se realizó un pago anticipado del 30% realizado el 1 de febrero del 2022 por \$17.107.348. Adicional se realizó una adición en tiempo y se realizó un pago final por \$39.917.145 el 23 de marzo del 2022, se entregaron las instalaciones en buena calidad y satisfacción.

1.1.2 Administración del proyecto por valor de: \$ 49.686.960

Producto MGA	Detalle Actividad				SALDO	%

		TOTAL PROYECTADO	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO		
Infraestructura para la investigación adecuada	Administración del proyecto	\$49.686.960	\$4.140.580	\$47.754.689,33	\$1.932.271	96,11%

En este periodo se vinculó el apoyo administrativo jurídico para continuar con la ejecución del proyecto es importante indicar que esta actividad está programada en el Gesproy por cada objetivo del proyecto por eso se repite para este objetivo se lleva una ejecución del 96,11% y se ha realizado de una manera coherente con la finalidad del mismo permitiendo contar con los informes en el tiempo pertinente según está contemplado en el documento técnico.

1.1.3 Apoyo a la supervisión

Producto MGA	Detalle Actividad	TOTAL PROYECTADO	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO	%
Infraestructura para la investigación adecuada	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$6.128.058	\$28.984.059,00	\$828.117,00	97,22%

Al igual que la anterior actividad se repite en cada objetivo para este lleva una ejecución física y financiera del 97,22% permitiendo contra con el personal idóneo para ejecutar esta actividad permitiendo dar solución a peticiones, consultas y/o dificultades que se puedan generar en la ejecución del proyecto.

1.2.1 Infraestructura para la investigación dotada por valor de: \$ 627.376.662 actividad a la cual se realizó una Resignificación quedando por valor de: \$ 675.646.790,90

Adquirir los equipos y software para el laboratorio

Producto MGA	Actividad MGA	Detalle Actividad	Valor Proyectoado	Valor Ejecutado	SALDO	%
Infraestructura para la investigación dotada	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	\$472.663.207,90	\$164.183.730,00	\$308.479.477,90	34,74%

Infraestructura para la investigación dotada	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	Adquirir los equipos y software para el laboratorio- Especie USCO	\$202.983.583,00	\$67.657.861,00	\$135.325.722,00	33,33%
TOTALES			\$675.646.790,90	\$231.841.591,00	\$443.805.199,90	68,07%

Con respecto a la adquisición de equipos y software se realizó lo siguiente:

El 02/03/2022 se realizó el pago por la compra de: IMPRESORA HP LASER M428 FDW POR \$2.900.000 Y 2 COMPUTADORES ACER ASPIRE A315-57G-53 POR UN VALOR DE \$ 7.000.000 por el contratista HECTOR MACIA OTALVARO con C.C 2344762 por un valor total de \$9.999.000

El 04/03/2022 se realizó el pago anticipado al Contrato de compraventa N° 217 del 29/12/2021, cuyo objeto es la adquisición de gafas de Rastreo ocular y descansa barbilla en el marco del convenio establecido entre la universidad de la Amazonia y la universidad Surcolombiana, por la compra de 3 descansa barbillas por un valor total de \$10.103.100 y 1 gafas con rastreo ocular por \$13.744.500 por un total de \$23.847.600, Pago por anticipado por valor de \$10.103.100.

De igual manera la Universidad Surcolombiana emitió certificación firmada por el Profesor Alfreidis González Hernández Coordinador del Proyecto por valor de \$ 67.657.861,00 con fecha 28 de febrero del 2022, según contrapartida de aporte de la USCO correspondiente a Equipos y Software desde el 03-03-2021 al 28-02 2022 el cual se registró en el aplicativo de Gesproy.

Entre los equipos adquiridos a la fecha del presente informe tenemos:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ADQUIRIDO
2	Portátil ACER ASPIRE A315-57G-53, Intel Core i5 1035G1 CPU 1.00 GHz, RAM de 8 GB, Windows 10 Pro 64 bits
1	IMPRESORA HP LASER M428 FDW
3	Descansa barbillas
1	Gafas con rastreo ocular
1	Adquisición de equipo de sistema BIOSEMI con sus respectivos accesorios

Como Segundo Objetivo específico del proyecto esta:

2. Caracterizar los procesos neuropsicológicos los sujetos de estudio y conformar los grupos de estudio

2.1 Artículos de investigación con un costo de: \$ 1.319.553.169 – actividad a la cual se le realizó una Resignificación quedando por un valor de: \$1.271.283.039,82

2.1.1 Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto cuyo costo es: \$9.042.368

Producto MGA	Actividad MGA	Detalle Actividad	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto	\$ 190.000,00	\$ -	\$ 190.000,00	0%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Especie USCO	\$ 2.227.440,00	\$ 2.227.440,00	\$ 2.227.440,00	100%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Efectivo USCO	\$ 3.312.464,00	\$ 2.153.101,00	\$ 1.159.363,00	65%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Efectivo U AMAZONIA	\$ 3.312.464,00	\$ -	\$ 3.312.464,00	0%
TOTAL			\$ 9.042.368,00	\$ 4.380.541,00	\$ 6.889.267,00	48%

Se expidió certificación de aportes en especie de docentes investigador y coinvestigador por la Decana (E) Zulma Yadira Cepeda de la facultad de Ciencias sociales y humanas del 22 de marzo del 2022, para el Docente Tiempo Completo de Planta Alfredis González Hernández por un valor de \$13.364.920 y que a esta actividad le corresponde un valor de \$2.227.440 para un total de \$16.458.720.

2.1.2 Seleccionar los sujetos de estudio

Durante el mes de febrero se realizó la selección de los sujetos del estudio actividad que requirió un avance por un valor de \$1.880.000.

Producto MGA	Actividad MGA	Detalle Actividad	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio	Seleccionar los sujetos del estudio	\$132.804.334,92	\$ 93.798.826,00	\$ 39.005.508,92	71%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio	Seleccionar los sujetos del estudio - Especie USCO	\$ 6.061.944,00	\$ 4.269.384,00	\$ 1.792.560,00	70%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio	Seleccionar los sujetos del estudio - Especie UA	\$ 828.116,00	\$ -	\$ 828.116,00	0%
TOTAL			\$139.694.394,92	\$ 98.068.210,00	\$ 41.626.184,92	70%

De igual manera se realizó viabilidad para realizar avance durante el mes de abril con el fin de continuar con la ejecución de esta actividad.

2.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.

Producto MGA	Actividad MGA	Detalle Actividad	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	\$889.207.342,00	\$322.383.171,90	\$566.824.170,10	36%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio. - Especie USCO	\$ 14.144.536,00	\$ 9.961.896,00	\$ 4.182.640,00	70%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio. - Especie U AMAZONIA	\$ 31.674.441,00	\$ 5.018.384,00	\$ 26.656.057,00	16%
TOTAL			\$935.026.319,00	\$337.363.451,90	\$597.662.867,10	36%

En el mes de febrero se realizó la compra de insumos consumibles de laboratorio y otros insumos requeridos para continuar con la ejecución del proyecto.

Durante el mes de marzo se realizó avance por valor de \$1.880.000 para gastos de transportes, el cual se realizó desde el 3 de marzo al 30 de marzo, en la ciudad de Neiva y Florencia; este avance se utilizó para gastos de viaje correspondiente al transporte urbano vía Terrestre, de Neiva y Florencia; para transportar los adultos mayores en las actividades de evaluación inicial "Este Viaje incluyó ida al laboratorio y retorno a lugar de origen" por lo tanto se hizo el reconocimiento el 28 de marzo del 2022 de dichos recursos.

Así mismo con el fin de continuar con la actividad el 28 de Marzo se inició trámite para un nuevo avance por valor de \$1.900.000 para gastos de transportes, los cuales se ejecutaran desde el 6 de Abril al 30 de Abril, para Neiva y Florencia respectivamente.

Dentro de las actividades que no presentan ejecución para el presente trimestre objeto del presente informe se encuentran:

2.1.4 Administración del proyecto

2.1.5 Apoyo a la supervisión

Como Tercer Objetivo específico tenemos las siguientes actividades las cuales a la fecha no presentan ejecución por lo tanto el presupuesto establecido para estas esta el 100% sin ejecutar.

3. Determinar de la sensibilidad y especificidad de un marcador cognitivo preclínico para el diagnóstico oportuno de la Enfermedad de Alzheimer para adultos mayores del Huila y Caquetá.

- 3.1.1 Divulgar y socializar resultados del estudio
- 3.1.2 Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación
- 3.1.3 Administración del proyecto
- 3.1.4 Apoyo a la supervisión

Por otra parte, a corte del 31/03/2022 se identificó que se encuentra pendiente por pagar lo relacionado a continuación:

CUENTAS POR PAGAR		
RUBRO		SALDO POR PAGAR
1. TALENTO HUMANO	Cuenta de cobro del personal vinculado para la ejecución correspondiente al mes de Marzo.	\$ 25.725.424,00
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	LA ROSA RESORTH	\$ 144.081.630,00
	DIDACTICOS Y LIBROS LTDA	\$ 13.744.500,00
	Comercializadora Mundo Hbc Zomac S.A.S	\$ 16.687.370,00
3. CAPACITACIÓN		\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS		\$ -
5. MATERIALES E INSUMOS		\$ -
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN		\$ -
7. GASTOS DE VIAJE	Reconocimiento avance del mes de Marzo de 2022	\$ 1.880.000,00
	Avance del mes de Abril	\$ 1.900.000,00
8. INFRAESTRUCTURA		\$ -
9. ADMINISTRATIVOS	Cuenta de Cobro del mes de marzo del Apoyo Administrativo- contable y del Apoyo Jurídico del Proyecto.	\$ 4.140.580,00
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	Cuenta de cobro del mes de Marzo del Apoyo a la supervisión.	\$ 2.484.348,00
11. OTROS		\$ -
TOTAL		\$ 210.643.852,00

Para finalizar me permito relacionar las actividades desarrolladas en el marco de la supervisión:

1. Se realizó revisión de las hojas de vida del personal de Talento humano a vincular para continuar con la ejecución del proyecto durante la vigencia 2022.
2. Se validó que el personal cumpliera con el perfil establecido en el presupuesto aprobado del proyecto.
3. Se emitieron oficios dando cumplimiento de los perfiles.
4. Se emitió oficios dando viabilidad a la solicitud de expedición de CDP y respectivos registros presupuestales del Talento Humano a vincular.
5. Se viabilizó la vinculación de personal a la ARL.
6. Se viabilizó la expedición de CDP para los gastos de viaje y adicional en dinero del Convenio suscrito entre la Universidad Surcolombiana y la UNIAMAZONIA.
7. Se validó la solicitud de RP que respaldara el adicional en dinero del Convenio suscrito entre la Universidad Surcolombiana y la UNIAMAZONIA.
8. Se atendieron las diferentes solicitudes del coordinador en ejecución del presente proyecto.
9. Se realizó revisión de las solicitudes realizadas por la coordinación del proyecto con el fin de salvaguardar la correcta ejecución de las actividades.
10. Se realizó revisión de la información reportada en el GESPROY durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente.
11. Se revisaron las alertas presentadas en el GESPROY y se acompañó a la coordinación del proyecto para la subsanación de las mismas.
12. Se Revisó y radico términos de referencia para pasantía Nacional
13. Se revisó y emitió concepto favorable de solicitud de CDP para los avances 011, 012 del mes de febrero, 013, 014 del mes de marzo y avance 015, 016 para el mes de abril.
14. Se emitió viabilidad a la solicitud de CDP para gastos de viajes y servicio de fotocopias.
15. Se dio viabilidad a la solicitud de CDP para realizar las actividades de protección de conocimiento y divulgación en el marco de ejecución del proyecto.
16. Se emitió concepto favorable para el reconocimiento de los avances 011, 012, 013 y 014 correspondientes al mes de febrero y marzo respectivamente.
17. Se realizó acompañamiento al coordinador del proyecto dando respuestas a las solicitudes, requerimientos y dudas con respecto a la ejecución del proyecto.
18. Se verificaron cuentas del personal vinculado de los meses de enero, febrero y marzo para el reconocimiento de estos.
19. Se realizó revisión y verificación de las cuentas correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo respectivamente.
20. Se verifico que los contratistas cumplieron con el aporte al Sistema Integral de Seguridad Social presentando planilla de pago de los respectivos aportes en salud, pensión, y riesgos laborales de conformidad con la clase de riesgo según las actividades desarrolladas.

7.1 PRESUPUESTO DETALLADO

A continuación, se presenta el presupuesto aprobado.

Código BPIN 2020000100011		MONTO APROBADO (\$):					
RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL	
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO		
1. TALENTO HUMANO	\$ 738.489.005	\$ 69.115.616	\$ 3.312.464	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 913.918.150	
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 424.393.079	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627.376.662	
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000	
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 216.074.066	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 216.909.468	
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034	
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 130.490.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.490.373	
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482	
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 149.060.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.060.880	
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 89.436.528	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.436.528	
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 1.901.531.315,82	\$ 272.099.199,00	\$ 17.879.032,00	\$ 100.524.003,00	\$ 14.041.028,00	\$ 2.306.074.577,82	

En el siguiente cuadro se encuentra los consolidados financieros por los rubros en la MGA y se establecen los saldos a corte 31/03/2022 ejecución que corresponde a un 35% del proyecto:



CÓDIGO DEL PROYECTO:												
Código BPIN 2020000100011		ACUMULADO					SALDO					
RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO			ESPECIE	EFFECTIVO			
1. TALENTO HUMANO	\$ 248.844.998,90	\$ 16.458.720,00	\$ 3.312.464,00	\$ 5.018.384,00	\$ -	\$ 273.634.566,90	\$ 489.644.006	\$ 52.656.896	\$ -	\$ 94.670.217	\$ 3.312.464	\$ 640.283.583
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 164.183.730,00	\$ 67.657.861,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231.841.591,00	\$ 260.209.349	\$ 135.325.722	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 395.535.071
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 154.804.999,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.804.999,00	\$ 61.269.067	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 62.104.469
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 12.532.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.532.000,00	\$ 117.958.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.958.373
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.024.493,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.024.493,00	\$ 148.255	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 5.376.989
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 47.754.689,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.754.689,33	\$ 101.306.191	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101.306.191
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 28.984.060,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.984.060,40	\$ 60.452.468	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.452.468
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 714.128.970,63	\$ 84.116.581,00	\$ 3.312.464,00	\$ 5.018.384,00	\$ -	\$ 806.576.399,63	\$ 1.187.402.345,19	\$ 187.982.618,00	\$ 14.566.568,00	\$ 95.505.619,00	\$ 14.041.028,00	\$ 1.499.498.178,19

A continuación, se presenta las actividades aprobadas por el OCAD de CTel y se especifica el estado de cada uno frente a los ajustes correspondiente a las Resignificaciones realizadas en lo que va de ejecución del proyecto ajustes que no alteran el valor del proyecto ni las fuentes de financiación así mismo son ajustes considerados por el ejecutor y que están tipificados en la norma:

Ítem	Nombre de la actividad MGA	Unidad	Cantidad	Vr. Inicial	Vr. Ajustado	Vr. Final
1.1.1	Adecuar infraestructura para laboratorio			\$62.401.482,00	\$62.401.482,00	\$62.401.482,00
1.1.2	Administración del proyecto			\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
1.1.3	Apoyo a la supervisión			\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
1.2.1	Adquirir los equipos y software para el laboratorio			\$627.376.662,00	\$ 675.646.790,90	\$675.646.790,90



2.1.1	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.			\$9.042.368,00	\$9.042.368,00	\$9.042.368,00
2.1.2	Seleccionar los sujetos del estudio			\$139.694.394,82	\$139.694.394,92	\$139.694.394,92
2.1.3	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.			\$1.091.317.270,00	\$1.043.047.141,00	\$1.043.047.141,00
2.1.4	Administración del proyecto			\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
2.1.5	Apoyo a la supervisión			\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
3.1.1	Divulgar y socializar resultados del estudio			\$107.254.338,00	\$107.254.338,00	\$107.254.338,00
3.1.2	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación			\$30.490.655,00	\$30.490.655,00	\$30.490.655,00
3.1.3	Administración del proyecto			\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
3.1.4	Apoyo a la supervisión			\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
TOTAL				\$2.306.074.577,82	\$2.306.074.577,82	\$2.306.074.577,82

8. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Hasta la fecha se ha cumplido lo establecido en el cronograma del proyecto, desde la coordinación del proyecto se manifiesta que se están realizando las actividades de planeación y que en el mes de diciembre de 2021 se realizó reprogramación para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto.

TIEMPO ACTIVIDAD ICA	AÑO 1												AÑO 2												AÑO 3													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Realizar las adecuación de infraestructuras para laboratorios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
Adquirir los equipos y software para los laboratorios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
Socializar del proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	X	X	X	X																																		
Seleccionar los sujetos de estudio				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									



11/06/2021 5:25	6.624.928	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE RODRIGO ALBERTO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
11/06/2021 5:25	331.246	1075288507	POLANIA ROJAS LAURA MELISSA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
11/06/2021 5:25	3.312.464	1075288507	POLANIA ROJAS LAURA MELISSA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
25/06/2021 5:32	4.785.820	1075294987	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
25/06/2021 5:29	2.336.893	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
25/06/2021 5:28	3.105.221	36309771	BONILLA SANTOS JASMIN	ACTI - HUILA	01-130100-DT
25/06/2021 5:29	5.465.565	7701283	MADRID CALDERON JUAN CARLOS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
27/08/2021 5:05	6.624.928	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE RODRIGO ALBERTO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
27/08/2021 5:05	3.312.464	1075288507	POLANIA ROJAS LAURA MELISSA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
27/08/2021 5:04	4.968.696	7701283	MADRID CALDERON JUAN CARLOS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
27/08/2021 5:06	7.556.558	1075294987	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
27/08/2021 5:04	3.689.832	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
27/08/2021 5:03	4.902.980	36309771	BONILLA SANTOS JASMIN	ACTI - HUILA	01-130100-DT
27/08/2021 5:05	4.114.082	1075312101	FORERO ALDANA ARNULFO EDUARDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
27/08/2021 5:03	1.987.478	1075291320	CALCETO GARAVITO LAURA NATALIA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
27/08/2021 0:00	2.352.000	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
27/08/2021 5:04	2.352.000	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
03/09/2021 5:24	10.434.261	1110540432	RUIZ LEON JHONATAN	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/09/2021 5:02	1.656.232	1075291320	CALCETO GARAVITO LAURA NATALIA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/09/2021 5:04	3.214.125	1082804872	SANCHEZ GUARNIZO RUDY MARCELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/09/2021 5:06	3.778.279	1075294987	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/09/2021 5:02	1.844.916	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/09/2021 5:04	3.312.464	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE RODRIGO ALBERTO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/09/2021 5:04	1.656.232	1075288507	POLANIA ROJAS LAURA MELISSA	ACTI - HUILA	01-130100-DT



29/09/2021 5:02	2.484.348	7701283	MADRID CALDERON JUAN CARLOS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/09/2021 5:02	2.451.490	36309771	BONILLA SANTOS JASMIN	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/09/2021 5:04	3.428.402	1075312101	FORERO ALDANA ARNULFO EDUARDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
05/10/2021 5:23	2.142.751	1078246875	RODRIGUEZ VAQUIRO RUDY DANIELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
14/10/2021 5:53	1.844.916	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
14/10/2021 5:54	3.312.464	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE RODRIGO ALBERTO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
14/10/2021 5:54	3.428.402	1075312101	FORERO ALDANA ARNULFD EDUARDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
14/10/2021 5:53	1.656.232	1075291320	CALCETO GARAVITO LAURA NATALIA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
14/10/2021 5:55	3.312.464	1075294987	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
14/10/2021 5:54	2.380.834	1078246875	RODRIGUEZ VAQUIRO RUDY DANIELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
14/10/2021 5:53	2.484.348	7701283	MADRID CALDERON JUAN CARLOS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
14/10/2021 5:55	1.656.232	1075288507	POLANIA ROJAS LAURA MELISSA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
14/10/2021 5:53	2.451.490	36309771	BONILLA SANTOS JASMIN	ACTI - HUILA	01-130100-DT
14/10/2021 5:55	3.571.250	1082804872	SANCHEZ GUARNIZO RUDY MARCELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
14/10/2021 5:55	1.656.232	1075305855	CUENCA PAREDES AURORA MARCELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
14/10/2021 5:53	3.312.464	1081422281	OLCUNCHE NOSCUE LAURA DANIELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
28/10/2021 5:28	101.004.541	891190346	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	ACTI - AMAZONAS	01-130100-DT
28/10/2021 5:28	6.297.480	891190346	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	ACTI - PUTUMAYO	01-130100-DT
28/10/2021 5:28	238.476.000	891190346	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	ACTI - TOLIMA	01-130100-DT
29/10/2021 5:13	960.000	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/10/2021 5:13	960.000	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
24/11/2021 5:06	2.451.490	36309771	BONILLA SANTOS JASMIN	ACTI - HUILA	01-130100-DT
24/11/2021 5:09	1.656.232	1075288507	POLANIA ROJAS LAURA MELISSA	ACTI - HUILA	01-130100-DT



24/11/2021 5:09	3.312.464	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE RODRIGO ALBERTO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
24/11/2021 5:07	2.484.348	7701283	MADRID CALDERON JUAN CARLOS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
24/11/2021 5:10	3.312.464	1075294987	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
24/11/2021 5:07	1.656.232	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
24/11/2021 5:09	3.428.402	1075312101	FORERO ALDANA ARNULFO EDUARDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
24/11/2021 5:07	1.656.232	1075291320	CALCETO GARAVITO LAURA NATALIA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
24/11/2021 5:09	2.380.834	1078246875	RODRIGUEZ VAQUIRO RUDY DANIELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
24/11/2021 5:09	1.656.232	1075305855	CUENCA PAREDES AURORA MARCELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
30/12/2021 0:00	1.656.232	1075305855	CUENCA PAREDES AURORA MARCELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
24/11/2021 5:07	3.312.464	1081422281	OLCUNCHE NOSCUE LAURA DANIELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
24/11/2021 5:09	3.571.250	1082804872	SANCHEZ GUARNIZO RUDY MARCELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
24/11/2021 5:07	596.243	1075221059	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
24/11/2021 5:07	993.739	1075221059	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
14/12/2021 5:36	77.127.469	900358506	DE LA ROSA RESEARCH S.A.S.	ACTI - CAQUETÁ	01-130100-DT
22/12/2021 0:00	9.937.392	1110540432	RUIZ LEON JHONATAN	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	2.484.348	1110540432	RUIZ LEON JHONATAN	ACTI - HUILA	01-130100-DT
22/12/2021 0:00	2.451.490	36309771	BONILLA SANTOS JASMIN	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	2.451.489	36309771	BONILLA SANTOS JASMIN	ACTI - HUILA	01-130100-DT
22/12/2021 0:00	3.312.464	1081422281	OLCUNCHE NOSCUE LAURA DANIELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	3.312.464	1081422281	OLCUNCHE NOSCUE LAURA DANIELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
22/12/2021 0:00	1.656.232	1075291320	CALCETO GARAVITO LAURA NATALIA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	1.656.232	1075291320	CALCETO GARAVITO LAURA NATALIA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
22/12/2021 0:00	2.484.348	7701283	MADRID CALDERON JUAN CARLOS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	2.484.348	7701283	MADRID CALDERON JUAN CARLOS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
22/12/2021 0:00	993.739	1075221059	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT



22/12/2021 0:00	1.656.232	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	1.656.232	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
22/12/2021 0:00	3.312.464	1075294987	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
22/12/2021 0:00	3.571.250	1082804872	SANCHEZ GUARNIZO RUDY MARCELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	3.571.250	1082804872	SANCHEZ GUARNIZO RUDY MARCELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
22/12/2021 0:00	3.312.464	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE RODRIGO ALBERTO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	3.312.464	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE RODRIGO ALBERTO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
22/12/2021 0:00	2.380.834	1078246875	RODRIGUEZ VAQUIRO RUDY DANIELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	2.380.834	1078246875	RODRIGUEZ VAQUIRO RUDY DANIELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
22/12/2021 0:00	3.428.402	1075312101	FORERO ALDANA ARNULFO EDUARDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	3.428.402	1075312101	FORERO ALDANA ARNULFO EDUARDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
22/12/2021 0:00	1.656.232	1075288507	POLANIA ROJAS LAURA MELISSA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	1.656.232	1075288507	POLANIA ROJAS LAURA MELISSA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
22/12/2021 0:00	8.034.382	1612767	PARRA RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
30/12/2021 0:00	5.386.689	1612767	PARRA RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	993.739	1075221059	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	1.920.000	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
30/12/2021 0:00	960.000	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
30/12/2021 0:00	1.340.000	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
30/12/2021 0:00	1.200.000	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
30/12/2021 0:00	846.761	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
30/12/2021 0:00	113.239	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	3.312.464	1075294987	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	1.214.570	1075257280	SANDOVAL OLIVERA	ACTI - HUILA	01-130100-DT
29/12/2021 0:00	550.060	1075246858	VARGAS RUIZ	ACTI - HUILA	01-130100-DT



- Las actividades si bien es cierto se han desarrollado con normalidad, dentro del cronograma propuesto en los siguientes meses se hace necesario que se desarrollen las actividades que presentan retrasos por la no contratación del personal o por temas de ley de garantías lo cual impide la contratación directa y genera que la modalidad de contratación sea diferente, causando retrasos y/o demoras en la contratación.
- Se reitera la necesidad del registro de información en cada proceso precontractual y en los detalles de los contratos en la plataforma del Gesproy por parte del Administrativo.
- Se recomienda a la coordinación del proyecto que en vista de los nuevos cambios en el aplicativo Gesproy se realice mayor control a la ejecución en vista de que en la plataforma ya no se cuenta con la platilla de contratación cargada con el fin de evitar reportes superiores a la contratación.
- Se requiere que el coordinador del proyecto en conjunto con el administrativo realice el cargue de las actas de liquidación no requiere de los contratos que se suscribieron en la vigencia 2021 y que su ejecución ya finalizo para ir cerrados contratos no sin antes registrar lo indicado en la segunda recomendación.
- Se encuentra pendiente el pago de los avances 013 y 014 al igual el pago del personal vinculado por valor de \$32.350.352 correspondiente al mes de marzo.

14. PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD (SI APLICA)

Hasta la fecha no se han realizado pruebas de laboratorio que requieran certificados de calidad.

15. ANÁLISIS APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y/O DE INSTALACIÓN Y/O DE SUMINISTRO Y/O DE ENTREGA DE PRODUCTOS (SI APLICA)

Hasta el momento no se han realizado entrega de productos oficiales pues depende del desarrollo de diferentes actividades en los meses que restan del proyecto.

16. RECOMENDACIONES

- Dentro de los procesos de planeación se recomienda a la coordinación realizar una revisión previa a las actividades programadas para el segundo año de ejecución con el fin de identificar posibles inconvenientes y proveerlos en procura de tener una adecuada ejecución.
- Se recomienda a la coordinación del proyecto a revisar que las correcciones realizadas en el SPGR con respecto a los terceros ajustados y la información precontractual migre correctamente de no suceder se hace necesario solicitar al DNP apoyo para una correcta sincronización de la información.
- Se hace necesario revisar agendas para evidenciar que en ellas se encuentren contempladas las horas a prestar durante el semestre 20221 y que así mismo se pueda certificar los aportes en especie aportado por la Universidad Surcolombiana.

17. CONTROL AMBIENTAL (SI APLICA)

No aplica

18. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES


- El proyecto se viene ejecutando de acuerdo a lo dispuesto en el cronograma y documento técnico aprobado.
- El proyecto lleva una ejecución del 35% con respecto al valor aprobado.

19. ANEXOS

A continuación, se anexa:

- ✓ Pantallazo del avance físico y financiero del proyecto.
- ✓ Pantallazo de la alerta presentada por el
- ✓ Copia certificación de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, del aporte de contrapartida en especie desde el 3 de marzo del 2021 hasta el 28 de febrero de 2022 en el rubro de equipos y software fechada del 28/02/2022 por valor de \$67.657.861,00.
- ✓ Copia de certificación de aporte en especie de la USCO correspondiente al periodo 06-2021 al 03-2022 con respecto a las horas ejecutadas por el Docente Alfredis González Hernández como Investigador y Coordinador del Proyecto y de la Docente Coinvestigadora Luisa Fernanda Muñoz Bernal por un valor total de \$16.458.720,00, certificación firmada por la Decana (E) de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas Zulma Yadira Cepeda; fechada del 22 de marzo de 2022.

20. FIRMA



CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA
Vicerrector de Investigación y Proyección Social
Supervisor



JENNIFER MONTERO VARGAS
Apoyo a la Supervisión VIPS SPGR-004 -A2022
C.C. 1.080.290.202 de Palermo Huila
T.P.: 70255178088TLM

Avance Físico: 29,96%

Avance Financiero: 40,74%

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Código BPIN: 202000100011 | Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad Alzheimer en adultos mayores del surcolombiano Huila, Caquetá

[Paso a Paso](#) [Aprobación y Envío](#)

Alcance


Realizar investigación para determinar un marcado preclínico para la detección temprana de la enfermedad de alzheimer en adultos mayores en el surcolombiano

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
No definido	No definido	
Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
\$ 0	\$ 0	No

* Cifras en pesos

[Indicadores Principales de Producto](#) [Histórico Estados](#)

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

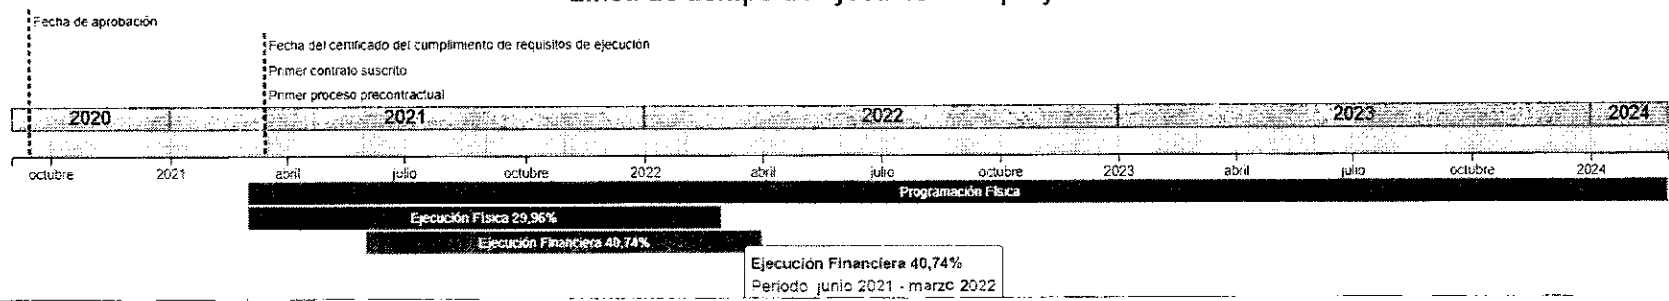



Alertas Aplicativo Gesproy

Actualmente presenta la siguiente alerta:

TIPO_ALERTA	TIPO INFORMACION	CÓDIGO ALERTA	DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN
ICO-Información incompleta	GESPROY-SGR	EJ-1-01	Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.	Proyectos: Contrato(s) sin rp : CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA:MEMORANDO N 0105-H

Alertas para el proyecto 2020000100011

x

Código	Descripción	Detalles	Valor Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ-1-01 ▲	Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.	Proyectos Contrato(s) sin rp : CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA MEMORANDO N 0105-H	\$0		Inmediato	1. El proyecto no cuenta con información completa y/o consistente según el estado, por lo tanto el indicador de cobertura de información es cero (0), que genera un IGPR =0, en la próxima medición.

EL SUSCRITO CORDINADOR DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE
NEUROCOGNICIÓN Y PSICOFISIOLOGÍA "PIEDAD GOODING LONDOÑO DE LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

CERTIFICA

La UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, ha realizado su aporte de contrapartida en especies desde el 3 de Marzo del 2021 hasta el 28 de febrero de 2022 en ejecución del proyecto "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ" con código BPIN 2020000100011, suscrito entre Universidad Surcolombiana, sistema General de Regalías y con la alianza la Universidad de la Amazonia", este aporte está presupuestado por un valor total de DOSCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$202.983.583), y hasta la fecha se ha ejecutado en contrapartida en especies SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MCTE \$ (\$\$ 67.657.861,00).

RUBRO EQUIPOS Y SOFTWARE

PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	CONTRAPARTIDA PROYECTADA (\$)	CONTRAPARTIDA EJECUTADA (\$)/12 PERIODOS
03-03-2021 al 28-02 2022	Uso de 2 computador portátil, equipos procesador:intel® coretm i5-4590 or amd fxtm 8350, equivalent or better. tarjeta gráfica: nvidia® geforce® gtx 970 or amd radeon™ r9 290 equivalent or better. (view the complete list). memoria: 4 gb ram or more. salida de video: displayport 1.2 or newer. puertos usb: 1x usb 3.0 or newer port. sistema operativo: windows®, 10 cameras de la universidad surcolombiana a cargo del inventario del docente alfredis gonzález hernández	Universidad Surcolombiana- del laboratorio de Neurofisiología y Psicofisiología Piedad Gooding Londoño	\$ 16.686.103,0	\$ 5.562.034,33
03-03-2021 al 28-02 2022	Uso de los equipos de Biosemi del laboratorio de Neurofisiología y Psicofisiología Piedad Gooding Londoño, para mediciones	Universidad Surcolombiana- del laboratorio de Neurofisiología y		



UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA

NIT- 891180044-7

ACREDITADA DE
ALTA CALIDAD

Resolución 11234 / 2018 - MEN

	psicofisiológicas a cargo del inventario del docente Alfredis González Hernández	Psicofisiología Piedad Gooding Londoño	\$180.000.000	\$60.000.000
03-03-2021 al 28-02 2022	E-Prime V.3 Licencia Perpetua Académico Nueva para un usuario, idioma Ingles, Entrega de Llave-USB,	Universidad Surcolombiana- del laboratorio de Neurofisiología y Psicofisiología Piedad Gooding Londoño	\$6.297.480	\$ 2.095.826,67
Valor Total			\$202.983.583,00	\$ \$ 67.657.861,00

El presente certificado se expide a los veintiocho (28) del mes febrero de 2022.

ALFREDIS GONZALEZ HERNANDEZ
 CORDINADOR DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN
 DENEUROCOGNICIÓN Y PSICOFISIOLOGÍA
 "PIEDAD GOODING LONDOÑO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
 Proyecto

JUAN CARLOS MADRID C
 Asesor administrativo y Contable

LA DECANA (E) DE LA FACULTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CERTIFICA QUE:


La UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, realizó su aporte de contrapartida para el primer año del proyecto **ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ BPIN2020000100011**

DOCENTES INVESTIGADORES:

PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO/PERFIL	DOCENTE	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	DEDICACION HORARIA POR SEMANA	CONTRAPARTIDA EJECUTADA (\$)
2021-06 al 2022-03	Investigador/a profesional en psicología con maestría	Luisa Fernanda Muñoz Bernal	Docente Tiempo Completo Ocasional	4	\$ 3.094.080
2021-06 al 2022-03	Investigador/a Coordinador del Proyecto - Profesional en psicología con doctorado	Alfredis Gonzalez Hernandez	Docente Tiempo Completo de Planta	10	\$ 13.364.640
Valor Total					\$ 16.458.720

El presente certificado se expide a los veintidós (22) días del mes de marzo de 2022.

Firma,


ZULMA YADIRA CEPEDA-RODRIGUEZ
 C.C 33.369.421
 Decana (E) Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Neiva, 10 de marzo de 2022

Doctor:
ALFREDIS GONZALEZ HERNANDEZ
Coordinador Proyecto Marcador Cognitivo
Universidad Surcolombiana

ASUNTO: Concepto favorable – Certificación aporte contrapartida en especie Universidad Surcolombiana, en el marco del proyecto BPIN 2020000100011

Cordial Saludo,

Una vez revisada la certificación de aporte de contrapartida en especies de la universidad Surcolombiana; la cual se encuentra firmada por el Docente ALFREDIS GONZALEZ HERNANDEZ quien funge como Coordinador del proyecto denominado "**ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ**"- BPIN 2020000100011, por valor de **\$67.657.861** correspondiente al periodo del 03 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022 quedando así un saldo por ejecutar de \$135.325.722,00; me permito emitir concepto favorable y a la vez indicé la necesidad de realizar el respectivo cargue de la certificación revisada en el aplicativo Gesproy dando cumplimiento a lo programación que reposa en dicha aplicación.

RUBRO EQUIPOS Y SOFTWARE

PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	CONTRAPARTIDA PROYECTADA (\$)	CONTRAPARTIDA EJECUTADA (\$) /12 PERIODOS
03-03-2021 al 28-02-2022	Uso de 2 computador portátil, equipos procesador: Intel® Core tm i5-4590 or amd fxm 8350, equivalente or better. Tarjeta gráfica: nvidia® geforce® gtx 970 or amd radeon™ r9 290 equivalent or better. (view the complete list). Memoria: 4 gb ram or more. Salida de video: displayport 1.2 or newer. Puertos usb: 1x usb 3.0 or newer port. Sistema operativo: Windows®, 10 cameras de la universidad surcolombiana a cargo del	Universidad Surcolombiana- del laboratorio de Neurofisiología y Psicofisiología Piedad Gooding Londoño	\$16.686.103,00	\$5.562.034,33

	inventario del docente Alfredis González Hernández			
03-03-2021 al 28-02-2022	Uso de los equipos de Biosemi del laboratorio de Neurofisiología y Psicofisiología Piedad Gooding Londoño, para mediciones psicofisiológicas a cargo del inventario del docente Alfredis González Hernández	Universidad Surcolombiana- del laboratorio de Neurofisiología y Psicofisiología Piedad Gooding Londoño	\$180.000.000,00	\$60.000.000,00
03-03-2021 al 28-02-2022	E-Prime V.3 Licencia Perpetua Académico Nueva para un usuario, idioma Ingles, Entrega de Llave-USB,	Universidad Surcolombiana- del laboratorio de Neurofisiología y Psicofisiología Piedad Gooding Londoño	\$6.297.480,00	\$2.095.826,67
Valor Total			\$202.983.583,00	\$67.657.861,00

Adjunto copia de la certificación del 28/02/2022.

Atentamente,



JENNIFER MONTERO VARGAS
Apoyo a la Supervisión
CPSP No. VIPS SPGR-004 A2022



JENNIFER MONTERO VARGAS <jennifer.montero@usco.edu.co>

Remisión informe trimestral proyecto marcador cognitivo del 17/01/2022 al 31/03/2022

1 mensaje

JENNIFER MONTERO VARGAS <jennifer.montero@usco.edu.co>
Para: Regalías Proyección Social y Proyectos Especiales <regalias@usco.edu.co>
Cc: MARIA PAULA DUSSAN OLIVEROS <maria.dussan@usco.edu.co>

6 de junio de 2022, 17:15

Buenas Tardes de acuerdo a la socialización del informe trimestral al Dr. Salamanca y una vez ajustado el mismo de acuerdo a lo observado.

Procedo a enviar adjunto el informe ajustado y sus anexos para proceder con la recolección de la firma del Vicerrector, dicho informe lo entregó el día de hoy en medio físico.




Cordialmente,

--

JENNIFER MONTERO VARGAS

Apoyo a la Supervisión proyecto Marcador Cognitivo BPIN 2020000100011
Cel. 315 895 99 77

3 adjuntos

-  **Certificado_Contrapartida USCO febrero 28 2022.pdf**
362K
-  **Certificación Contrapartida USCO del 01_06_2021 al 30_03_2022.pdf**
468K
-  **Informe supervisión interventoria proyectos SGR No. 4 Corte 17_01_2022 al 31_03_2022 Vers. FINAL.pdf**
673K
